
# Förderfahrplan

Inklusionsberatung gUG · Arbeitsmarktprojekt für arbeitslose Menschen ab 50 mit neu erworbener Behinderung · November 2026 bis März 2030

**Kritischer Pfad:** gUG mit geprüfter gemeinnütziger Satzung bis Ende Januar 2027 → Anträge Aktion Mensch und HePAS-Projektförderung im Januar 2027 → EGZ- und HePAS-Anträge **vor** Arbeitsaufnahme im März 2027 → Projektstart und erste Auszahlungen im April 2027.

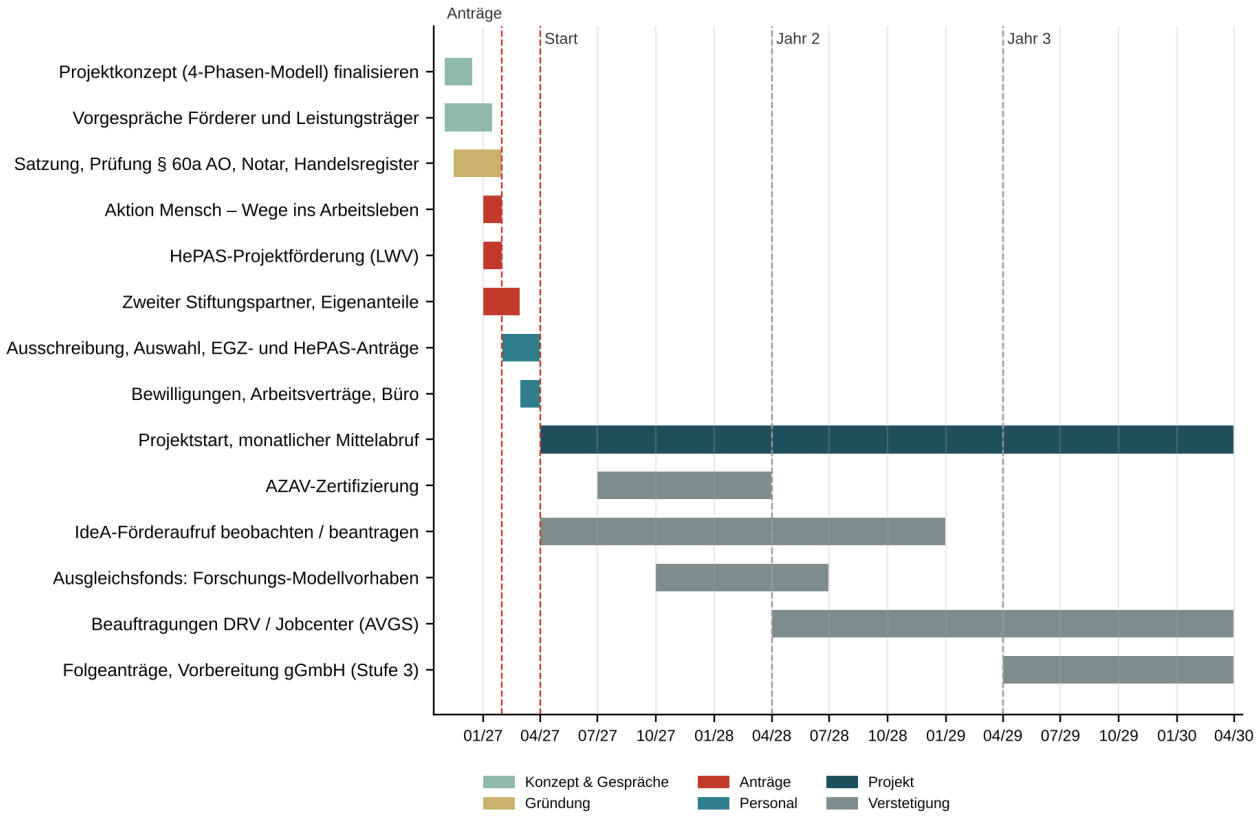

## 1. Finanzierungsbausteine und Zuordnung zum Finanzplan

| Baustein | Geldgeber | Betrag 3 Jahre | Antrag | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Stiftung – Kernförderung | Aktion Mensch „Wege ins Arbeitsleben“ | 300.000 € | Jan. 2027 | Höchstbetrag; mind. 10 % Eigenmittel |
| Stiftung – Ergänzung | Zweite Stiftung / Lotterie | 118.963 € | Jan.–Feb. 2027 | Deckt den Rest des Stiftungsbedarfs |
| Staatliche Projektförderung | LWV Hessen, HePAS-Projektförderung | 90.000 € | Jan. 2027 | 30.000 € je Jahr, Auszahlung im April |
| Eingliederungszuschuss | Agentur für Arbeit / Jobcenter | 222.314 € | Feb.–März 2027 | 3 Stellen, je vor Arbeitsaufnahme |
| HePAS-Einstellungsprämien | LWV Hessen Integrationsamt | 18.000 € | März 2027 | 3 × 6.000 €; Zusatzprämie 50+ prüfen |
| Eigenerlöse | Beratung, Workshops, Vorträge | 30.000 € | laufend | Deckt Eigenanteile |
| **Summe** | | **779.278 €** | | **entspricht den Gesamtkosten von 779.278 €** |

## 2. Fahrplan im Detail

| Zeitraum | Schritt | Ansprechpartner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | Projektkonzept nach 4-Phasen-Modell ausarbeiten: Zielgruppe, Wirkungsziele, Teilnehmerzahl, Forschungsdesign | – | Projektskizze (5–8 Seiten) |
| Nov.–Dez. 2026 | Vorgespräche zu Förderfähigkeit, Höhe und vorzeitigem Maßnahmebeginn | Aktion Mensch (Regionalberatung bzw. Wohlfahrtsverband), LWV Hessen Integrationsamt, Kreis Gießen (Arbeitsmarkt), Agentur für Arbeit Gießen (Arbeitgeber-Service), DRV Hessen | Rückmeldung zur Förderfähigkeit, Eckwerte bestätigt |
| Nov. 2026–Jan. 2027 | Gründung der gUG: gemeinnützige Satzung, Prüfung nach § 60a AO, Notar, Handelsregister, Geschäftskonto | Steuerberatung, Finanzamt Gießen, Notariat | Gemeinnützigkeitsbescheinigung als Antragsvoraussetzung |
| Dez. 2026 | Mitgliedschaft in einem Wohlfahrtsverband prüfen; Hochschulpartner für Forschung gewinnen | z. B. Paritätischer Hessen; Hochschulen in Gießen | Kooperationsvereinbarung / Letter of Intent |
| Jan. 2027 | Hauptanträge einreichen: Aktion Mensch „Wege ins Arbeitsleben“ und HePAS-Projektförderung | Aktion Mensch Online-Antrag; LWV Hessen | Anträge eingereicht |
| Jan.–Feb. 2027 | Zweiten Stiftungspartner und Eigenmittel einwerben | Deutsche Fernsehlotterie, regionale Stiftungen, Sparkassenstiftung | Zusage über rund 118.963 € |
| Feb. 2027 | Stellenausschreibung; Kandidatinnen und Kandidaten mit Agentur/Jobcenter abstimmen (besonders betroffene SB ab 55) | Agentur für Arbeit / Jobcenter Gießen, Integrationsfachdienst | Besetzungsvorschläge |
| März 2027 | EGZ- und HePAS-Anträge vor Arbeitsaufnahme; Arbeitsverträge; Büro und Ausstattung | Agentur für Arbeit, LWV Hessen | Bewilligungen, Verträge unterschrieben |

| Zeitraum | Schritt | Ansprechpartner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| April 2027 | Projektstart; erster Mittelabruf; staatliche Projektförderung Jahr 1 | alle Förderer | Projekt läuft, Liquidität gesichert |
| Juli 2027–März 2028 | AZAV-Zertifizierung als Träger (Grundlage für AVGS-Abrechnung) | Fachkundige Stelle (Zertifizierer) | Trägerzulassung |
| ab April 2027 | Förderaufrufe IdeA (ESF Plus Hessen) beobachten; Antrag mit Kofinanzierung des Kreises | WIBank, Kreis Gießen | Ergänzendes Folgeprojekt |
| Okt. 2027–Juni 2028 | Forschungsbaustein als Modellvorhaben beim Ausgleichsfonds | BMAS, Fachstelle DRV Knappschaft-Bahn-See | Antrag Modellvorhaben |
| April 2028 | Zwischenbericht und Verwendungsnachweis Jahr 1; staatliche Projektförderung Jahr 2 | Aktion Mensch, LWV Hessen | Mittel für Jahr 2 gesichert |
| ab April 2028 | Beauftragungen aufbauen: DRV (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben), AVGS über Jobcenter | DRV Hessen, Jobcenter, Berufsgenossenschaften | Erste Regelfinanzierung |
| April 2029 | EGZ sinkt auf 40 %; staatliche Projektförderung Jahr 3; Evaluation | Agentur für Arbeit, LWV Hessen | Wirkungsnachweis |
| ab April 2029 | Folgeanträge und Verstetigung; Vorbereitung der Umwandlung in eine gGmbH (Stufe 3) | Förderer, Steuerberatung, Notariat | Anschlussfinanzierung ab April 2030 |

## 3. Checkliste Antragsunterlagen

- Satzung, Handelsregisterauszug, Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit (§ 60a AO)
- Projektbeschreibung mit Zielgruppe, Bedarf, Wirkungszielen und Partizipation der Zielgruppe
- Kosten- und Finanzierungsplan mit allen Drittmitteln (EGZ und HePAS gesondert ausweisen)
- Stellenbeschreibungen; Vergütung nicht über TVöD (Besserstellungsverbot)
- Kooperationszusagen (Hochschule, Wohlfahrtsverband, Arbeitgeber, Kreis)
- Nachweis Eigenmittel bzw. Zusage zweiter Stiftungspartner
- Bei Bedarf: Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn

## 4. Risiken und Gegenmaßnahmen

| Risiko | Gegenmaßnahme |
|---|---|
| Bewilligung erst nach April 2027 | Vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragen; Liquiditätspuffer aufstocken; Personal gestaffelt einstellen |
| Stiftungsbedarf höher als Aktion-Mensch-Höchstbetrag | Zweiten Stiftungspartner früh ansprechen; Sachkosten gezielt über Kleinstiftungen |
| Geschäftsführung bei Aktion Mensch nur 5 Std./Woche förderfähig | GF-Kosten über HePAS-Projektförderung, Eigenerlöse und zweite Stiftung decken |
| Geeignete Bewerbende nicht rechtzeitig gefunden | Frühe Abstimmung mit Agentur/Jobcenter und Integrationsfachdienst; ggf. HePAS-Probebeschäftigung |
| Auslaufen der Projektmittel 2030 | AZAV-Zulassung und DRV-Beauftragungen ab 2028 als Regelfinanzierung |

Grundlage: Konzept und Finanzierungsplan der Inklusionsberatung gUG (Stand 24.10.2026). Programmkonditionen vor Antragstellung bei den Förderern bestätigen lassen.
